

# PROYECTO: PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS

**CONTRATO No. 3633**


**OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE GIRON**

**INFORME No. 8**

**PERIODO: 25 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO Y ENTRE 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2020**

## 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

### 1.1. LOCALIZACION

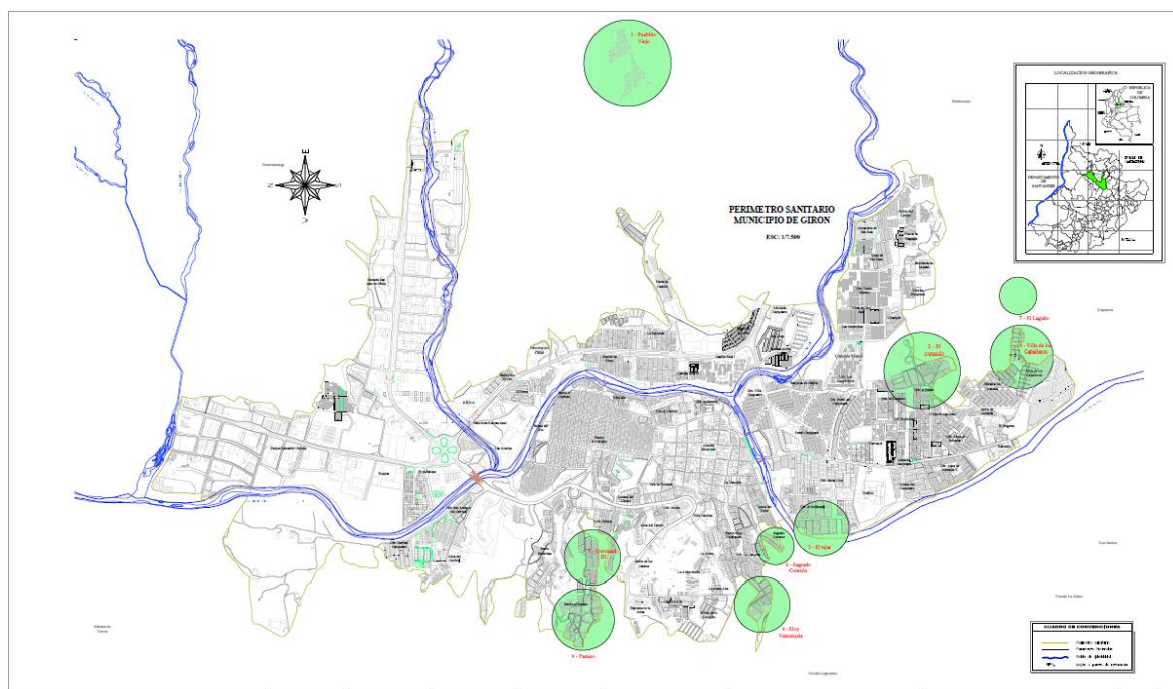

Mediante el contrato 003633 se ejecutaron obras en los siguientes sectores del municipio de Girón:

- Optimización sistema alcantarillado Barrio Tejar: carrera 29 con calles 27- 27b, carrera 29a con calles 27- 27b, calle 27 entre carreras 29 y 29<sup>a</sup>, calle 27b entre carreras 29 y 29<sup>a</sup>.
- Optimización sistema alcantarillado Barrio Eloy Valenzuela: Calle 30 entre carreras 33c y 31, calle 29a entre carreras 32 y 31, carrera 32 entre calles 30 y 29<sup>a</sup>, carrera 31 entre calles 30 y 29<sup>a</sup>.

- Construcción acometidas domiciliarias Barrio Pueblito Viejo.
- Optimización sistema alcantarillado Barrio Sagrado Corazón: calle 28 con carrera 31 y 29.
- Reposición acometidas domiciliarias Barrio El Consuelo: calle 14 entre calles 19a y 22.
- Optimización sistema alcantarillado Barrio El Paraíso: calle 43 entre carrera 34a y 33.
- Optimización sistema alcantarillado Barrio Corviandi III – calle 44 entre carrera 32a y 31b- calle 44 entre carrera 31b y 31a - calle 44 entre carrera 31a y 31 - calle 44 entre carrera 31 y 29a – calle 34a entre carrera 31 y 29a - Municipio de Girón,
- Construcción sistema Alcantarillado Barrio El Laguito
- Construcción sistema pluvial Barrio Villa de los Caballeros.

## 2. ACTIVIDADES TECNICAS DE EJECUCION

CONTRATO DE OBRA N° 3633		
BARRIO		TEJAR
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Preliminares	Se realiza actividades relacionadas con infraestructura vial; tal como excavación de via , conformación de subrasante, Demolición de bordillos y andenes Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados
2	Señalización	N/A
3	Campamento	N/A
4	Movimientos De Tierra	Excavación para sumidero transversal
5	Tuberías Prefabricadas	N/A
6	Estructuras	Instalación de base granular Instalación de pavimento en MR para terminación via Bordillos y andenes
7	Varios	Limpieza de obra Instalación de rejillas de sumidero transversal

<b>CONTRATO DE OBRA N° 3633</b>		
<b>BARRIO</b>		<b>CORVIANDI III</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>
1	Preliminares	Socialización de la actividad Campamento Pancartas informativas Demolición de las placas de concreto de tubería de aguas lluvias. Cercado con sacos de arena en pozos para dirigir el agua lluvia a sumideros existentes, para evitar que se empoce en la excavación.
2	Señalización	Cerramiento con tela verde, señalización (BARRICADAS) y canalización tránsito.
3	Campamento	Rotura de pavimento en concreto con espesor entre 0.16 m y 0.25 m
4	Movimientos De Tierra	Instalación de base granular Rellenos y compactación De 0.00 a 2.50 metros de profundidad
5	Tuberías Prefabricadas	Suministro e instalación de tubería de D=14" -355mm
6	Estructuras	N/A
7	Varios	Retiro de materiales de excavación y demolición Aseo y limpieza Demolición de tuberías existentes en gres Densidades

<b>CONTRATO DE OBRA N° 3633</b>		
<b>BARRIO</b>		<b>LAGUITO</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>
1	Preliminares	Socialización de la actividad Campamento Pancartas informativas Demolición de las placas de concreto de tubería de aguas lluvias. Cercado con sacos de arena en pozos para dirigir el agua lluvia a sumideros existentes, para evitar que se empoce en la excavación.
2	Señalización	Cerramiento con tela verde, señalización (BARRICADAS) y canalización tránsito.
3	Campamento	Rotura de pavimento en concreto con espesor entre 0.16 m y 0.25 m
4	Movimientos De Tierra	Instalación de base granular Rellenos y compactación De 0.00 a 2.50 metros de profundidad
5	Tuberías Prefabricadas	Suministro e instalación de tubería de D=14" -355mm
6	Estructuras	N/A
7	Varios	Retiro de materiales de excavación y demolición Aseo y limpieza Demolición de tuberías existentes en gres Densidades

CONTRATO DE OBRA N° 3633		
BARRIO		TRES ESQUINAS – SAGRADO CORAZON
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Preliminares	• Demolición de andenes
2	Señalización	N/A
3	Campamento	N/A
4	Movimientos De Tierra	• Excavación en zanja
5	Tuberías Prefabricadas	• Reposición con redes domiciliarias
6	Estructuras	• N/A
7	Varios	Construcción de andenes y sardineles Mejoramiento de subrasante, aplicación de base granular

CONTRATO DE OBRA N° 3633		
BARRIO		EL PARAISO
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Preliminares	N/A
2	Señalización	• Pasacalles • Señalización de tránsito
3	Campamento	N/A
4	Movimientos De Tierra	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados
5	Tuberías Prefabricadas	N/A
6	Estructuras	• Suministro y colocación de concreto de 3000 psi • Suministro y colocación de acero de refuerzo $f_y = 2590 \text{ kg/cm}^2$ • Mampostería de ladrillo para pozos de inspección • Andenes en concreto de 2500 p.s.i., $e = 0.10 \text{ m}$
7	Varios	Demolición de pisos, sardineles, canaletas y escaleras

### 3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION

OBRA N°	UBICACIÓN	FECHA	SITUACIÓN PRESENTADA
3633	Corviandi III	13 -03-2020	Se identifica rellenos saturados antes de la intervención, se requiere hacer mejoramiento
3633	Paraíso	03-03-2020	Rompimiento de un tubo de gas

Nota: se presenta suspensión el 20 de Marzo por requerimiento de la presidencia de realizar cuarentena, para solventar emergencia sanitaria por COVID-19.

#### 4. RELACION DE ACTAS

- Acta N°1: Acta de verificación de personal.  
Acta N°2: Acta de inicio del contrato de obra.  
Acta N°3: Acta de entrega de anticipo.  
Acta N°4: Acta de recibo y pago parcial N°1  
Acta N°5: Acta de recibo y pago parcial N°2  
Acta N°6: Modificación en plazo al contrato.  
Acta N°7: Mayores y menores cantidades de obra N°1.  
Acta N°8: Mayores y menores cantidades de obra N°2.  
Acta N°9: Adición al valor fiscal.  
Acta N°10: Acta de entrega de anticipo.  
Acta N°11: Mayores y menores cantidades de obra N°3  
Acta N°12: Acta de recibo y pago parcial N°3  
Acta N°13: Mayores y menores cantidades de obra N°4  
Acta N°14: Acta de ampliación de plazo y valor fiscal.  
Acta N°15: Acta de recibo y pago parcial N°4  
Acta N°16: Mayores y menores cantidades de obra N°5  
Acta N°17: Acta de recibo y pago parcial N°5  
Acta N°18: Acta de entrega de anticipo adicional n°2.  
Acta N°19: Acta de Suspensión  
Acta N°20: Acta de Reinicio

#### 5. INFORME FINANCIERO

<b>CONTRATO 3633</b>						
<b>COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL CONTRATO 3633</b>						
	<b>FECHA</b>	<b>CDP</b>	<b>RP</b>	<b>RECURSOS CONVENIO INI</b>	<b>EMPAS S.A.</b>	<b>TOTAL</b>
Valor inicial contrato	17/05/2019	398	1040	10.086.287.403		10.086.287.403
Adicion 1	5/12/2019	591	1597		1.674.601.000	1.674.601.000
Adicion 2 Conv	18/01/2020	210	179		3.368.542.698	3.368.542.698
<b>TOTAL APORTES</b>				<b>10.086.287.403</b>	<b>5.043.143.698</b>	<b>15.129.431.101</b>
<b>RELACION PAGOS CONTRATO 3633</b>						
<b>Acta</b>	<b>FECHA</b>	<b>RP</b>	<b>VALOR ACTA</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>VALOR NETO</b>	
Anticipo	5/08/2019	1040	3.504.590.125	0	3.504.590.125	
Pago Parcial 1	21/10/2019	1040	1.009.474.923	350.753.028	658.721.895	
Pago Parcial 2	28/10/2019	1040	992.632.524	344.900.953	647.731.571	
Anticipo	11/12/2019	1597	581.858.307	0	581.858.307	
Pago Parcial 3	23/12/2019	1040	6.867.754.639	2.386.275.953	4.481.478.686	
Pago Parcial 4	7/02/2020	179	784.024.061	272.417.677	511.606.384	
					0	
<b>TOTAL</b>				<b>3.354.347.611</b>	<b>10.385.986.968</b>	

## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO

### 6.1. TEJAR

- ANTES



- DURANTE



- DESPUES



### 6.2. EL CONSUELO

- ANTES



- DURANTE



- DESPUES



### 6.3. SAGRADO CORAZON

- ANTES



- DURANTE



- DESPUES



## TRES ESQUINAS – SAGRADO CORAZON

- ANTES



- DURANTE



- DESPUES



## 6.4. VILLA DE LOS CABALLEROS

- ANTES



- DURANTE





- DESPUES



### 6.5. EL LAGUITO

- ANTES



- DURANTE



### 6.6. CORVIANDI

- ANTES



- DURANTE



- DESPUES




### 6.7 EL PARAISO

- ANTES

- 



- DURANTE

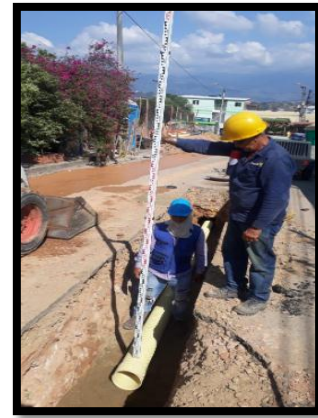

- DESPUES



## 6.8 ELOY VALENZUELA

- ANTES

- 



- DURANTE



- DESPUES



## 7 CONTRATO INTERVENTORIA

<b>CONTRATO No.:</b>	<b>003623 DE 2019</b>
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	26 de Junio de 2019
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$1.279.321.400

<b>PLAZO INICIAL:</b>	09 meses	
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	03 meses	
<b>ANTICIPO:</b>	15%	\$1.279.321.400
<b>FECHA DE INICIO:</b>	25 de Julio de 2019	
<b>CONTRATISTA:</b>	CISGO SAS	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Jenny Patricia Gómez Guisa	
<b>NIT:</b>	901.230.3475	
<b>SUPERVISOR:</b>	Cesar Augusto Cordero Cáceres	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	24 de abril de 2020	
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	20 de Marzo de 2020	
<b>FECHA REINICIO</b>	28 de Julio de 2020	
<b>TOTAL:</b>		\$1.557.019.800
<b>CONTRATOS RELACIONADOS:</b>	Contrato de Obra No. 003633 de 2019	
<b>CONTRATOS RELACIONADOS:</b>	Contrato de Obra No. 003634 de 2019	
